


ROUTE DES NATIONS


semestriel

N°9 Janvier 2022

CALENDRIER DES TRAVAUX

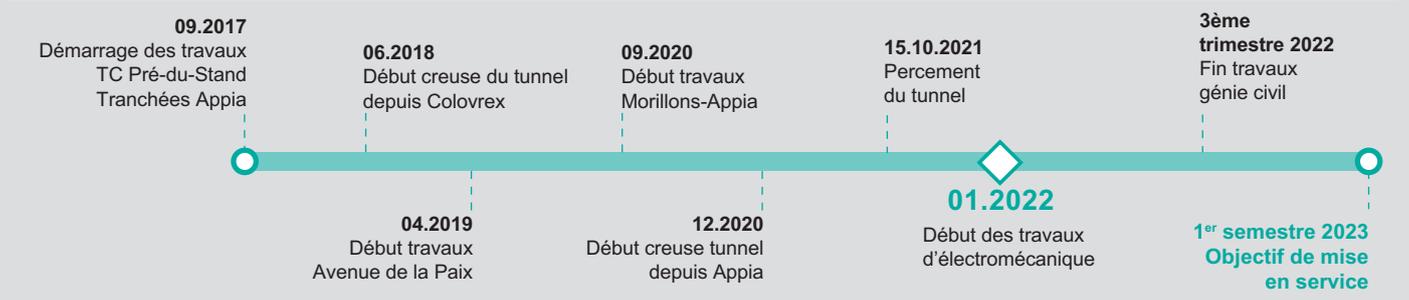


FINANCES au 31.12.2021 (en millions HT)

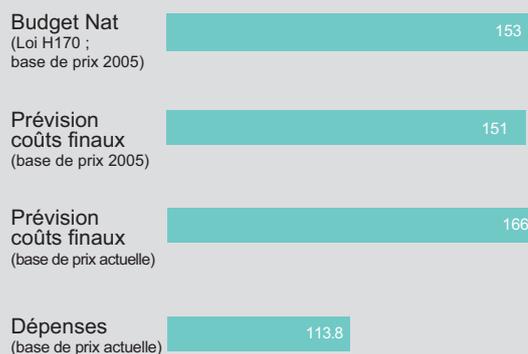

DONNÉES au 31.12.2021

Taux d'avancement global	66%
Nombre d'ouvriers	60
Nombre d'entreprises (4) et bureaux (8)	30

AVANCEMENT DU GÉNIE CIVIL au 31.12.2021



Cérémonie de percement du tunnel - Vendredi 15.10.2021

ÉTAT DES TRAVAUX JANVIER 2022

Le chantier de la route des Nations compte, au 15 janvier 2022, 52,5 mois de travaux. Suite à plusieurs aléas géologiques et à la Covid-19, à ce jour, l'objectif est de mettre en service la route des Nations pour la fin du 1er semestre 2023.

Les travaux d'aménagements intérieurs et de génie-civil vont se poursuivre durant toute l'année 2022; ces travaux impliquent une grande coactivité et cohabitation entre les différentes entreprises sur site. En outre l'interruption de nombreuses chaînes d'approvisionnement à cause de la crise sanitaire et la pénurie sur certains matériaux pourrait décaler la date de la mise en service de la route des Nations.

Tunnel : creuse de la voûte

La creuse des 215 derniers mètres de calotte s'est déroulée du 15 juin 2021 au 15 octobre 2021 sans difficultés géologiques particulières, permettant ainsi de progresser selon les cadences prévues.

Le 15 octobre 2021 les deux fronts de creuse d'Appia et de Colovrex se sont rejoins, permettant ainsi de célébrer la Sainte-Barbe avec 1.5 mois d'avance (date officielle de la Sainte-Barbe étant le 4 décembre). Ce fut également l'occasion pour le conseiller d'État de remercier chaleureusement toutes les personnes ayant œuvré sur ce projet et en particulier les ouvriers.

Tunnel : suite des travaux

La place aux réjouissances fut de courte durée, car dès le 18 octobre 2021, les travaux ont repris tambour battant avec en ligne de mire la fin du béton armé du tunnel au 3ème trimestre 2022. Pour cela, les travaux suivants devront être réalisés en parallèle :

- Creusement du stross (partie du tunnel située entre les galeries de pied et sous la calotte),
- Etanchéités périphériques,
- Anneau intérieur en béton armé,
- Banquettes en béton pour les futurs équipements,
- Remblayage, pose des tubes GéniLac, enrobés et marquage

Tranchée couverte Pré-du-Stand et local technique Colovrex

La réalisation du béton armé du local technique est désormais terminée et les travaux de second œuvre et d'équipement ont pris place (peinture, serrurerie, etc.).

Les travaux de gros œuvre consistent désormais en la réalisation de la jonction entre la tranchée couverte Pré-du-Stand et le tunnel.

Tranchées ouvertes et couvertes Appia

Les travaux de gros œuvre sont terminés, le portail sud du tunnel est terminé.

Issue de secours Voie-du-Coin

Les travaux de béton armé et d'aménagements extérieurs sont terminés. Et c'est donc naturellement que les travaux de second œuvre et d'équipement débuteront au tout début de cette année 2022.

Avenue Appia – Morillons

Les travaux sur l'avenue Appia débutés en septembre 2020 s'achèveront courant 2022. Ce sont actuellement 4 étapes sur 8 qui ont déjà été réalisées.

Carrefour Foretaille Colovrex

Le réaménagement du carrefour Foretaille débutera au début de l'année 2022, à la suite des travaux de la JAG dans ce secteur, pour une durée d'environ 6 mois.




Local technique Colovrex



Creusement du stross



Issue de secours Voie-du-Coin

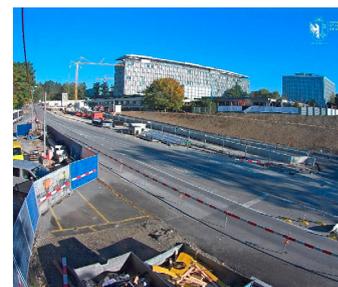

Carrefour Appia-Morillons



LA ROUTE DES NATIONS, UN NOUVEL AXE FORT POUR GENÈVE

La route des Nations servira à relier l'autoroute au quartier des organisations internationales et à la route de Lausanne. Elle entraîne le réaménagement de la Jonction autoroutière du Grand-Saconnex qui anticipe l'élargissement de l'autoroute à trois voies dans les deux sens de circulation, entre l'aéroport et le Vengeron. En termes de mobilité, ces futures infrastructures permettent :

- d'améliorer l'accès aux organisations internationales
- de réduire le trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy
- de développer la desserte des transports collectifs
- d'optimiser et de sécuriser les conditions de circulation pour la mobilité douce

Objectif de mise en service : fin du 1^{er} semestre 2023

GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE

Votre point d'information et d'échanges sur les questions de mobilité à Genève



- +41 22 546 87 00
- ge-transports
- ge_transports
- ge-transports@etat.ge.ch
